



V3 St 2580 (FTO) Bau-km 0+000 bis 5+160
 Kontrolle der zu fallenden Bäume vor Baubeginn auf potenzielle Quartiere und ggf. weitere Maßnahmen zum Fledermausauschutz

V4 St 2580 (FTO) Bau-km 0+000 bis 5+565
 Alle Baumfällungen und Gehölzbesetzungen werden ausschließlich im Zeitraum zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchgeführt (Schutz von Nesten / Eiern und nachfolgenden Jungvögeln in Gehölzen brütender Vögelarten)

BW 4/1 St 2580 über OFW Bau-km 4+039,335 bis 4+039,335
 L.W. = 7,90 m
 L.H. = 4,50 m
 Breite zw. d. Geländem 11,35 m
 Kr. Winkel 66,361 gon
 Verkehrslasten gem. EC

S1T St 2580 (FTO) Bau-km 0+000 bis 5+565
 Schutzzone für zu erhaltende Straßenbegleitgehölze, Gewässerbegleitgehölze und Feuchtbiootope an der Dorfer, eine Baumhecke bei Bau-km 1+300-dies Weichgraben und Baumhecken am Mittleren Isar-Kanal während der Bauphase und den Weichgraben

BW 3/3 St 2580 über den Mittleren Isar Kanal Bau-km 3+751,541 bis 3+751,541
 L.W. = 44,00 m
 L.H. = 45,20 m
 L.H. = 2,30 m (ü WW)
 Breite zw. Geländem 11,35 m
 Kr. Winkel 77,823 gon
 Verkehrslasten gem. EC

M1T St 2580 (FTO) Bau-km 0+030 bis 5+565
 Einbegleitung von Fahrspalten der St 2580 alt und von Fußwegabschnitten, Ummantelung in unversiegelte, begrunte Straßenbenutzbereichen

BW 4/2 Brücke geplante ED 99 über St 2580 Bau-km 4+236,589 bis 4+236,589
 L.W. = 20,55 m / 20,55 m
 L.H. = 21,55 m / 21,55 m
 L.H. = 4,70 m
 Breite zw. d. Geländem 11,60 m
 Kr. Winkel 101,369 gon
 Verkehrslasten gem. EC

AK St 2580 (FTO) Bau-km 0+000 bis 4+750
 Geeignete Flächen für produktionsgerechte Maßnahmen zur Verbesserung der Halbbegrünung in der landschaftlichen Flur für den Kogelz-Anlagebereich jährlich wechselnden Bruchflächen jenseits einer ca. 5 m breiten Freifläche auf 25 % der Fläche. Gesamtgröße der geeigneten Flächen A3-LRF AK3: 31 ha (s. Blatt 7, Übersichtsplan)

AT St 2580 (FTO) Bau-km 0+100 bis 4+900
 Geeignete Flächen für produktionsgerechte Maßnahmen zur Verbesserung der Halbbegrünung in der landschaftlichen Flur für die Feldspiegel-Anlage von Leuchtdiensten, Blütenrispen und/oder feingliedriger Stäbe im Gelände auf 10 % der Fläche. Gesamtgröße der geeigneten Flächen AT1 bis AT4: 114 ha (s. Blatt 7, Übersichtsplan)

S1T St 2580 (FTO) Bau-km 0+050 bis 5+565
 Wiederbepflanzung der neuen und der baurechtlich genehmigten Straßenbepflanzungen und Verkehrsmittel der St 2580 mit Hecken aus standortheimischen und autochthonen Sträuchern bzw. Bäumen und Sträuchern

S1T St 2580 (FTO) Bau-km 0+000 bis 5+565
 Schutzzone für zu erhaltende Straßenbegleitgehölze, Gewässerbegleitgehölze und Feuchtbiootope an der Dorfer, eine Baumhecke bei Bau-km 1+300-dies Weichgraben und Baumhecken am Mittleren Isar-Kanal während der Bauphase und den Weichgraben

V3 St 2580 (FTO) Bau-km 3+700 und 5+300
 Fällung von Bäumen mit potenziellen Quartieren für Fledermäuse nur zwischen Anfang September und Mitte Oktober, vorsichtige Vorgehens- und Lagemaßnahmen der Bäume bis etwaige ggf. verbleibende Tiere ausgeflogen sind, dies erfüllt, wenn ein Befreiung der Quartiere vorab durch einen Fledermausexperten ausgeschlossen werden kann.

G4T St 2580 (FTO) Bau-km 3+700 bis 3+780
 Wiederherstellung der baurechtlich in Anspruch genommenen Biotope am Mittleren Isar Kanal. Pflanzung von standortheimischen und autochthonen Blüten- und Sträuchern. Anlage von offenen Magerstandorten

S2 St 2580 (FTO) Bau-km 3+780
 Beschränkung des Baufeldes auf das unbedingt notwendige Maß und Schutzraum für Zaundeckenscheibenelemente am Mittleren Isar Kanal während der Bauphase

V2 St 2580 (FTO) Bau-km 0+530 bis 3+780
 Ablängen von Zaundeckenscheiben aus den zu überbauenden Lebensräumen im April/Mai vor dortigem Baubeginn; Verbringen der Tiere in die vorgesehene umgesetzte Maßnahme FCS 2.


A2 St 2580 (FTO) Bau-km 0+530 bis 4+175
 Entwicklung von Zaundeckenscheibenhäuten auf den neuen Straßenbepflanzungen. Anlage von flächigen Mageren Gras-Staudenfluren mit kleinen Buschgruppen; alle 15 m Schotterpflanzungen; streifenförmig über die gesamte Bepflanzungshöhe, 1 m tief, ebenerdig aufgeteilt mit Grobkoen (Korngröße 10-30 cm), Umschichten der Schotterpflanzungen mit Kies-Sand-Lagerungsmittel, möglichst davon keine Gruben aus kleineren Straucharten mit niedriger Besetzung (Fläche jeweils 5-10 m²), versetzt auch ein Großstauden oder Einzelbaum (Gesamtlänge der Maßnahme: ca. 1.170 m)

V7 St 2580 (FTO) Bau-km 0+415 bis 4+200
 Dauerhafter Schutzraum für Zaundeckenscheiben am Bankett entlang der Maßnahmeflächen A2 (zukünftige Lebensräume der Zaundeckenscheiben auf den neuen Bepflanzungsflächen); Eigenschichten: Höhe mind. 40 cm (s. d. Boden, glattes Material mit Überkettenschutz und mind. 20 cm breiter Lauffläche, fest mit dem Boden verbunden

A3 St 2580 (FTO) Bau-km 3+780
 Optimierung der Habitat der Lieferpopulation der Zaundeckenscheiben am Mittleren Isar Kanal: Habitatverbesserung der südöstlichen Böschung des Kanals zwischen FTO und ED9; abschließende bzw. punktuelle Rücknahme dichter Gebüsche und/oder Säuberungsschnitt vertikaler Gras- und Staudenfluren (3-jährlich), die Maßnahme ist im Herbst/Winter vor dem Ablängen der Zaundeckenscheiben (vgl. V2) durchzuführen

V6 St 2580 (FTO) Bau-km 4+200 bis 4+400
 Die Baubegrenzung findet ausschließlich im Zeitraum zwischen 01. Sept. und 28. Febr. statt und das Baufeld wird vegetationsfrei gehalten (Schutz von Nesten / Eiern und nachfolgenden Jungvögeln von Fledermaus und Waiseln)

LANDKREIS ERDING
 Gemeinde Oberding
 Gemarkung Oberding

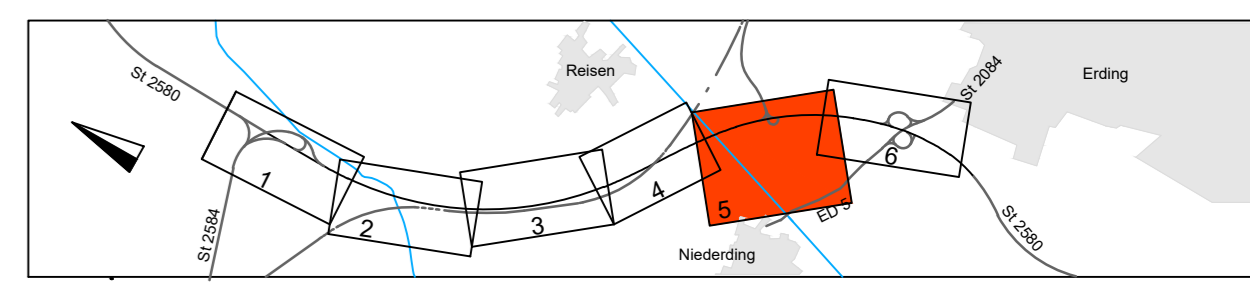

Grünplan GmbH Prinz-Ludwig-Straße 48 85354 Freising P. Schneider	Tel: 0816113015 Fax: 0816112099 info@gruenplan.de 10070000@gruenplan-gmbh.de	Datum bearbeitet gezeichnet geprüft	Zeichen PS PS PS
---	---	--	---------------------------

Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Freising Fachbereich Straßenbau München Wittmannstraße 41 85374 München Tel: 08917923370 E-Mail: bauamt@staatsbauamt.bayern.de	Reg.-Nr.: 1402-6-4m-SPT
--	-------------------------

Nr.	Art der Änderung	Name	Zeichen
-----	------------------	------	---------

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern	Unterlage / Blatt-Nr.: 9.1 / 5.T
Straße / Abschn.-Nr. / Station: S2580_140_0,000 bis S2580_140_5,148	Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1 : 1.000

St 2580, Flughafentangenten Ost
 4-streifiger Ausbau der St 2580
 zwischen der St 2584 und der St 2084
 Bau-km 0+000 bis Bau-km 5+150
 St 2580_140_0,000 bis St 2580_140_5,148

1. Teitur aufgestellt
 München, den 24.09.2021
 Staatliches Bauamt Freising

 P. Schneider
 Kr.-St. Bauingenieur

1. Teitur zur Planfeststellung
 vom 19.12.2013
